



# 第22回豊丘村リニア対策委員会説明資料


## リニア関連電力供給設備

2020年11月19日

中部電力パワーグリッド(株)  
リニア関連送変電工事所

資料の複製・転写はご遠慮願います。

### 下伊那変電所 土地造成工事の状況 (1)



写真①-1 沈砂調整池堰堤 構築状況



写真①-2 沈砂調整池堰堤 コンクリート打設状況



# 下伊那変電所 土地造成工事の状況 (2)

写真② 搬入道路 擁壁構築状況



写真④ 変電所ヤード伐採状況



写真③ 搬入道路 擁壁構築状況



写真⑤ 変電所ヤード伐採状況



3 資料の複製・転写はご遠慮願います。

## 変電所工事の進捗スケジュール

項目	2018年度	2019年度		2020年度		2021年度		備考
	10～3	4～9	10～3	4～9	10～3	4～9	10～3	
村道・県道改修				県道長沢田倉線追加工事実施				
土地造成工事	仮設設備	▼3/4着手						・仮設道路造成 ・仮設排水路設置 ・仮設沈砂池構築
	伐採	伐採・除根共		伐採 除根 (切土・盛土に併せて実施)				1回目：道路・沈砂調整池周辺 2回目：その他
	土留擁壁			▼12月土留擁壁 (2基) 本体構築完了				土留擁壁 2基
	沈砂調整池			堰堤	水叩き・最終樹			
	搬入道路							
	切土・盛土							
機器・基礎・建物工事								2024年10月 運転開始予定まで

4 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事の進捗状況

小笠川線No.13以降の国有林内は、記載を省略しています。



○凡例

● : 仮設工事中	● : 仮設工事完了
○ : 基礎工事中	○ : 基礎工事完了
○ : 組立工事中	○ : 組立工事完了
— : 架線工事中	— : 架線工事完了
● : 撤去	○ : 仮工事

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那 南合幹	0/2 基	0/2 基	0/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	0/9 基	0/10 基	0/10 基	0/10 基	0/11 径間
小笠川線	16/20 基	2/20 基	2/20 基	0/20 基	0/21 径間


5 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事の進捗状況



6 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事の車両通行ルート

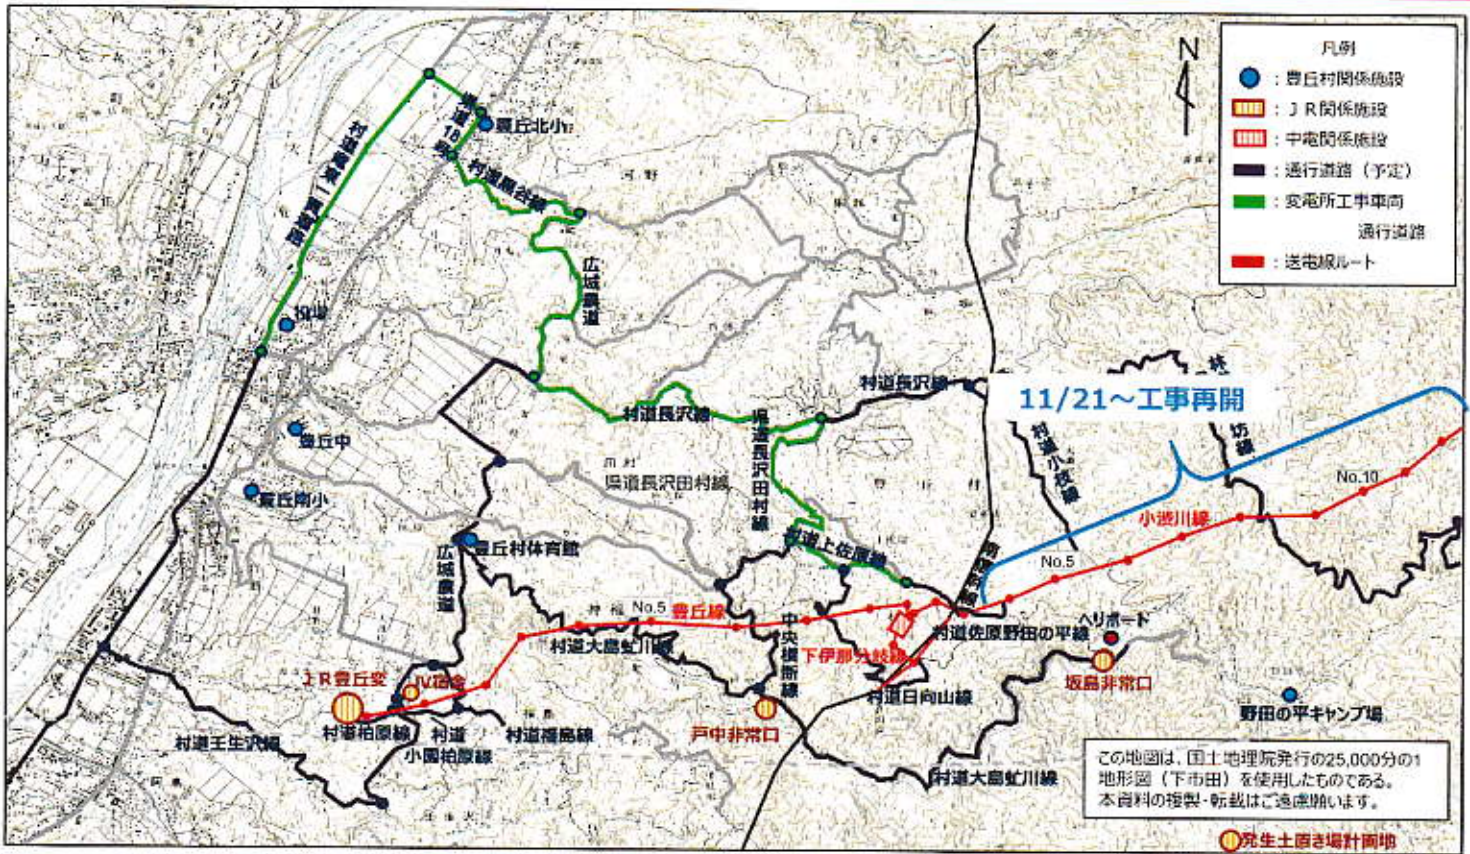

7 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事のスケジュール

地区名	2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3
林区	野田平	小渋川線 (5~20)										
	上佐原	小渋川線 (1~4)										
	下佐原	豊丘線 (4~5)										
	木門											
福島区	本村											
	寺島1											
	大柏											

<凡例>

- : 小渋川線の工事
- : 豊丘線の工事
- : 南信幹線の工事
- : 架線工事
- : 休工 (止め山等)

8 資料の複製・転写はご遠慮願います。

■中部電力パワーグリッド株式会社  
リニア関連送変電工事所

〒395-0085 飯田市吾妻町100番地

Tel 0265-54-6902 fax 050-7771-9001

土日・祝日を除く、午前9時～午後4時30分まで

9 資料の複製・転写はご遠慮願います。



中部電力パワーグリッド
